

Avaliação da Qualidade de Tensão

REGISTROS DA MEDIÇÃO DAS MÉDIAS

VALORES DOS INDICADORES REGISTRADOS


ÍNDICE	TENSÃO		
	V_A	V_B	V_C
DRP	9.62%	0.79%	6.74%
DRC	0.00%	0.00%	0.00%
MÁXIMA	134.88	133.12	134.79
MÍNIMA	115.29	116.68	116.18
MÉDIA	121.68	121.86	121.96

GRÁFICO DE MEDIÇÕES

OBS: Tensão base do sistema (100%) -


127

VOLTS

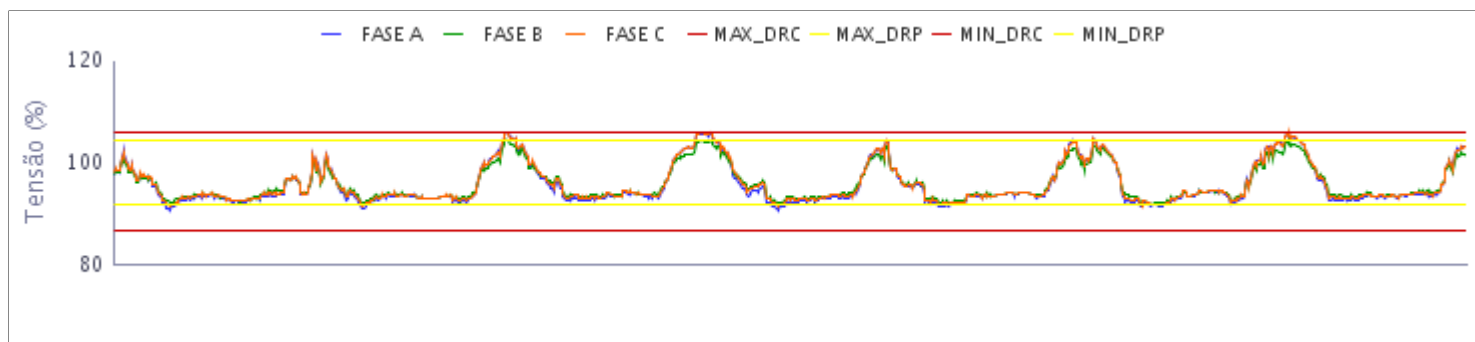

HISTOGRAMA DE TENSÃO

FAIXA	QUANT. REGISTROS		
	Fase A	Fase B	Fase C
Registros	1008	1008	1008
< 0.80	0	0	0
0.80 - 0.81	0	0	0
0.81 - 0.82	0	0	0
0.82 - 0.83	0	0	0
0.83 - 0.84	0	0	0
0.84 - 0.85	0	0	0
0.85 - 0.86	0	0	0
0.86 - 0.87	0	0	0
0.87 - 0.88	0	0	0
0.88 - 0.89	0	0	0
0.89 - 0.90	0	0	0
0.90 - 0.91	0	0	0
0.91 - 0.92	23	0	1
0.92 - 0.93	91	41	66
0.93 - 0.94	275	189	232
0.94 - 0.95	221	334	287
0.95 - 0.96	50	59	49
0.96 - 0.97	31	54	46
0.97 - 0.98	48	53	48
0.98 - 0.99	23	40	29
0.99 - 1.00	34	44	34
1.00 - 1.01	32	40	36
1.01 - 1.02	30	41	30
1.02 - 1.03	38	50	35
1.03 - 1.04	48	30	48
1.04 - 1.05	27	28	28
1.05 - 1.06	20	5	17
1.06 - 1.07	17	0	22
1.07 - 1.08	0	0	0
1.08 - 1.09	0	0	0
1.09 - 1.10	0	0	0
1.10 - 1.11	0	0	0
1.11 - 1.12	0	0	0
1.12 - 1.13	0	0	0
1.13 - 1.14	0	0	0
1.14 - 1.15	0	0	0
1.15 - 1.16	0	0	0
1.16 - 1.17	0	0	0
1.17 - 1.18	0	0	0
1.18 - 1.19	0	0	0
1.19 - 1.20	0	0	0
> 1.20	0	0	0

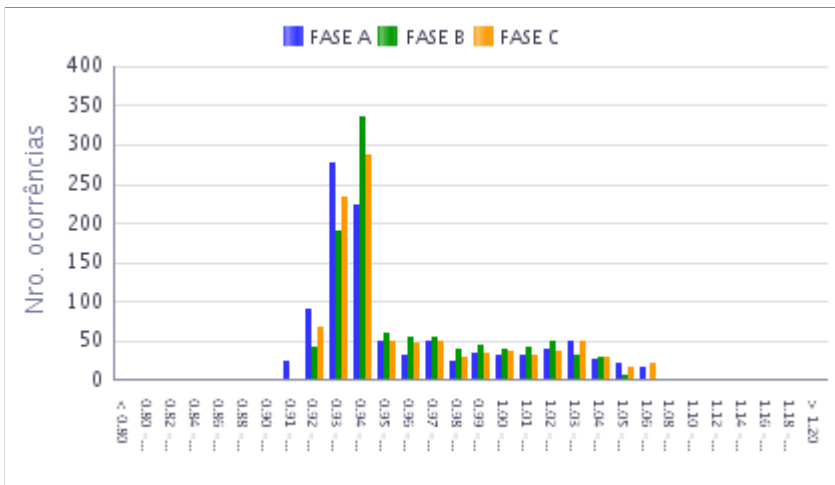

RESULTADO DA MEDIÇÃO

As tensões registradas pela medição gráfica não estão em conformidade com os limites estabelecidos pela ANEEL no Módulo 8 do PRODIST.

GLOSSÁRIO

PRODIST

Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional.

DRP = Duração Relativa de Tensão Precária

Indicador individual referente a duração relativa das leituras de tensão, nas faixas de tensão precárias, no período de observação definido, expresso em percentual.

DRC = Duração Relativa de Tensão Crítica

Indicador individual referente a duração relativa das leituras de tensão, nas faixas de tensão críticas, no período de observação definido, expresso em percentual.

	Data	Hora
Início de Medição	28/04/2026	11:40
Término de Medição	05/05/2026	11:40

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA MACHADO

UC	106615580
Trafo	8940847951

Conforme estabelecido pela ANEEL no Módulo 8 do PRODIST, os limites vigentes para os indicadores DRP e DRC são os seguintes:

DRP Máximo	3.00%	MEDIÇÃO INICIAL
DRC Máximo	0.50%	
LIMITES ADEQUADOS:		Reclamação
Máxima	Mínima	
133	117	
